

REPORTE DE INCIDENCIA

Número de Reporte: RI.CE. 010

Fecha: 03 07 2023

Destinatario: ENA ESTE

DD MM AA

Concesionaria: ENA ESTE, S.A.

Tipo de incidencia:
Pavimento rígido.

Localización Geográfica
Troncal
Corredor Este

OBJETO DEL REPORTE

Informar a ENA sobre el estado actual en que se encuentra la estructura del pavimento para su evaluación y sean reparadas por metodología de desconchamiento de losas.

PELIGROS REGISTRADOS

1	Daños a vehículos que transitan por la vía.
2	Disminución del nivel de servicio de la vía.
3	Continuidad del deterioro de la estructura de pavimento.

RESUMEN GENERAL DEL REPORTE

La inspección realizó el levantamiento de las losas afectadas en la troncal del Corredor Este, donde se recomienda que estas puedan ser atendidas por la metodología de desconchamientos.

Este reporte se presenta un levantamiento fotográfico donde se puede observar el área deteriorada, su ubicación y las cantidades aproximadas para reparación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO BRISAS – PANAMERICANA)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
1		19 + 865	0.15	0.15	1	0.02
2		20 + 010	0.20	1.00	1	0.20
3		20 + 850	0.40	0.50	1	0.20

REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO BRISAS – PANAMERICANA)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
4		22 + 550	0.50	0.50	1	0.25
5		23 + 200	0.70	0.70	1	0.49
6		24 + 705	0.15	0.40	1	0.06

REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO BRISAS – PANAMERICANA)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
7		24 + 780	0.15	1.20	1	0.18
8		25 + 000	0.15	0.50	1	0.08
9		26 + 850	0.15	0.40	1	0.06

REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO BRISAS – PANAMERICANA)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
10		27 + 020	0.40	0.60	1	0.24
11		28 + 000	0.15	0.50	1	0.08
TOTAL (SENTIDO BRISAS – PANAMERICANA)						1.85

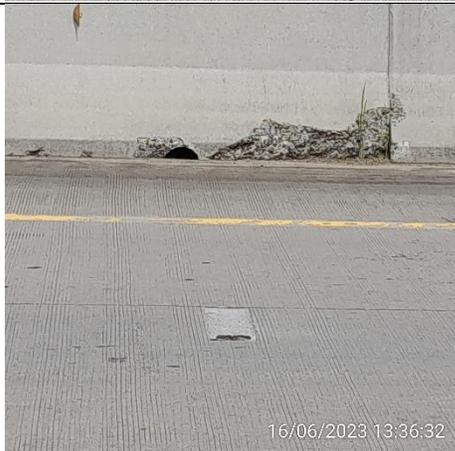
REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO PANAMERICANA - BRISAS)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
1		28 + 050	0.20	0.40	1	0.08
2		26 + 500	0.15	0.15	1	0.02
3		26 + 150	0.25	0.40	1	0.10

REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO PANAMERICANA - BRISAS)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
4		25 + 800	0.15	0.40	1	0.06
5		25 + 700	0.20	0.20	1	0.04
6		25 + 300	0.15	2.50	1	0.38

REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO PANAMERICANA - BRISAS)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
7		24 + 100	0.30	0.50	1	0.15
8		23 + 850	0.20	0.50	1	0.10
9		23 + 800	0.20	0.60	1	0.12

REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO PANAMERICANA - BRISAS)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
10		23 + 800	0.20	0.70	1	0.14
11		23 + 400	0.30	0.70	1	0.21
12		23 + 400	0.25	0.50	1	0.13

REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO PANAMERICANA - BRISAS)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
13		22 + 315	0.25	0.25	1	0.06
14		22 + 305	0.15	0.50	1	0.08
15		22 + 260	0.40	0.80	1	0.32

REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO PANAMERICANA - BRISAS)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
16		22 + 230	0.15	0.50	1	0.08
17		22 + 220	0.15	0.40	1	0.06
18		21 + 570	0.20	0.40	1	0.08

REGISTRO FOTOGRÁFICO (SENTIDO PANAMERICANA - BRISAS)						
ÍTEM	FOTOGRAFÍA	UBICACIÓN (PK)	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD	ÁREA (M2)
19		21 + 480	0.15	0.50	1	0.08
20		21 + 200	0.20	0.80	1	0.16
TOTAL (SENTIDO PANAMERICANA - BRISAS)						2.43

Conclusiones

1. Se requiere intervenir aproximadamente 4.50 m2 de la estructura de pavimento indicado en el reporte para reparación por desconchamiento de losas. Sujeto a evaluación por parte de ENA S.A.
2. Ejecutar el presupuesto 2023 destinado para desconchamiento de losas.
